



施工者：安藤ハザマ・丸昭地域維持型建設共同企業体 二重峠トンネル作業所
住所：阿蘇市内牧1128-2 電話：0967-24-6411



現在の作業状況について

・避難坑

トンネル掘削 L = 1729m (10/30 現在)

・本坑

トンネル掘削 切羽① L = 896m

切羽② L = 595m

切羽③ L = 9m 合計 L = 1500m (10/30 現在)

覆工 L = 627m (10/30 現在)

避難坑から横穴を掘り、本坑切羽③の掘削を開始しました。

【作業横坑（横穴）】



【本坑①切羽状況】



また、本坑②においても、防水シート貼付、覆工コンクリートの打設作業を開始しております。


【本坑② 防水シート台車】



【本坑② セントル(移動式の型枠)】



～覆工コンクリート打設の流れ～

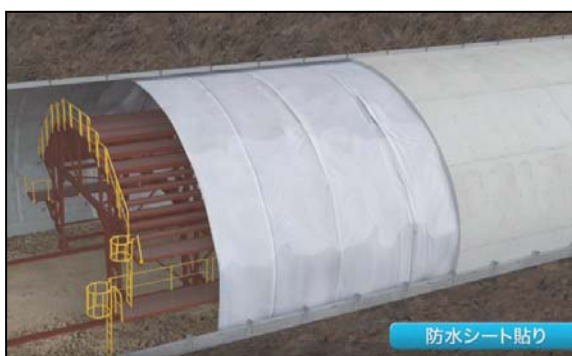

防水シート貼り



覆工コンクリート




覆工コンクリート

①地下水がトンネル内にしみ出てこないよう ②セントルを用いて、防水シートとセントル シート台車によりトンネル表面を の間にコンクリートを流し込みます。 ③覆工コンクリート打設の完了です。 防水シートで覆います。

①～③の工程を長さおよそ10mごとに繰り返し、トンネルの内壁を仕上げていきます。

現在の進捗

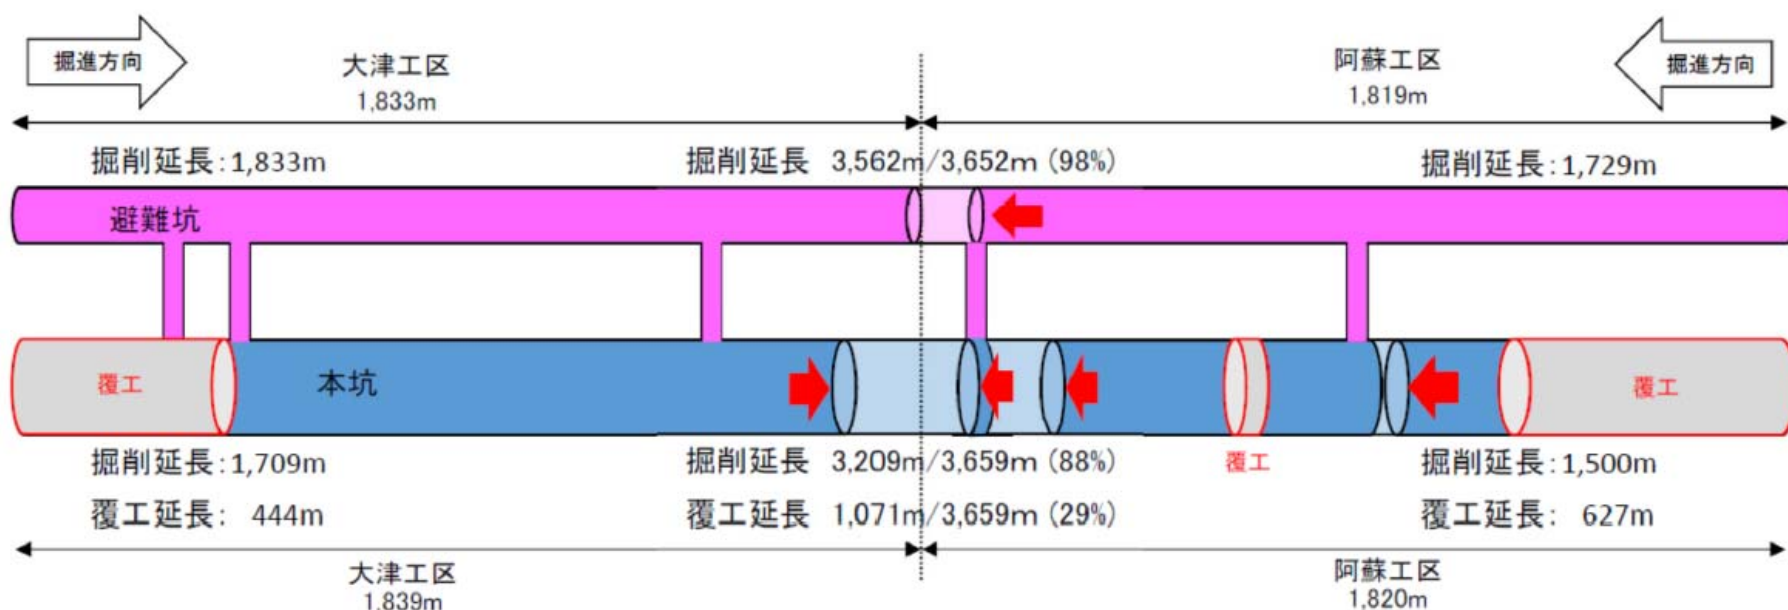

今後の作業予定について

引続き本坑、避難坑ともに昼・夜間での発破掘削を日曜日も含め行っていきます。騒音・振動には最大限に配慮して施工を進めてまいりますので、地域の皆様の引続きのご協力の程お願いいたします。

トピックス

○9月27日(木)、阿蘇西小学校の全生徒約130名を招いた見学会を開催しました。



25tダンプの迫りに皆さん驚かれていました



1年生の集合写真です



作業所ホームページのQRコードです。

ホームページでは、最新の進捗状況や工事紹介動画等がご覧になれます。

熊本地震による大規模な斜面崩壊により通行不能となっている国道57号の復旧のため、北側復旧ルート of 事業を進めており、1日も早い復旧に向け、全力で取り組んで参ります。何かお気づきの点がありましたら、ご連絡下さい。
